

Statusbericht

SB 3



Projektangaben	
Projekt	Baubetrieb
Nummer	B2
Datum Statusbericht	26.11.2009

Projektbeteiligte	
Auftraggeber	Herr Dipl.-Ing. R. Rupp
Betreuer	Prof. Dr. -Ing. A. Hilmer/Prof. Dr. -Ing. Th. Kögl
Experte	-
Autor Statusbericht	PL: Schindler Florian

Zusammenfassung			
Posten	IST	Begründung	Tendenz
Termine	grün 	Im soll	→
Qualität / Leistung	grün 	Im soll	→
Motivation	grün 	gut	→
Legende IST-Situation:		Legende Tendenz:	
 = auf Kurs  = vom Kurs leicht abgewichen  = stark vom Kurs abgewichen		↑ = Verbesserung → = gleich bleibend ↓ = Verschlechterung	

Übersicht der Arbeiten	
Abgeschlossene Arbeiten	Informationsbeschaffung 99% seitens des Bauherren 100% seitens der technischen Leitung 100% andere Medien 99% Systementwicklung 99% Vorgänge zuordnen 100% Access Tabellen erstellen 100% Informationen in Access eingeben 99% Kostenkontrolle im MS Project 99% Know How Verknüpfungen/Beziehungen erstellen 99% System Umsetzung 99% Ausarbeitung Konzept 99%
Laufende / offene Arbeiten	System alpha Version 80% Flussdiagramm 0% Präsentation 0%

Statusbericht

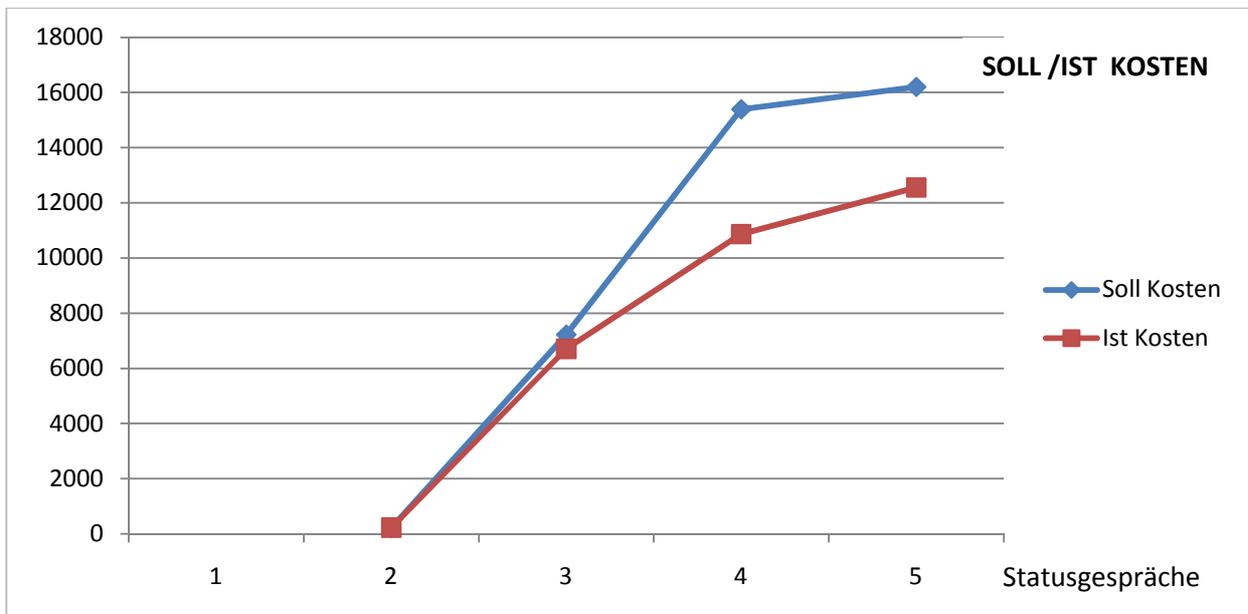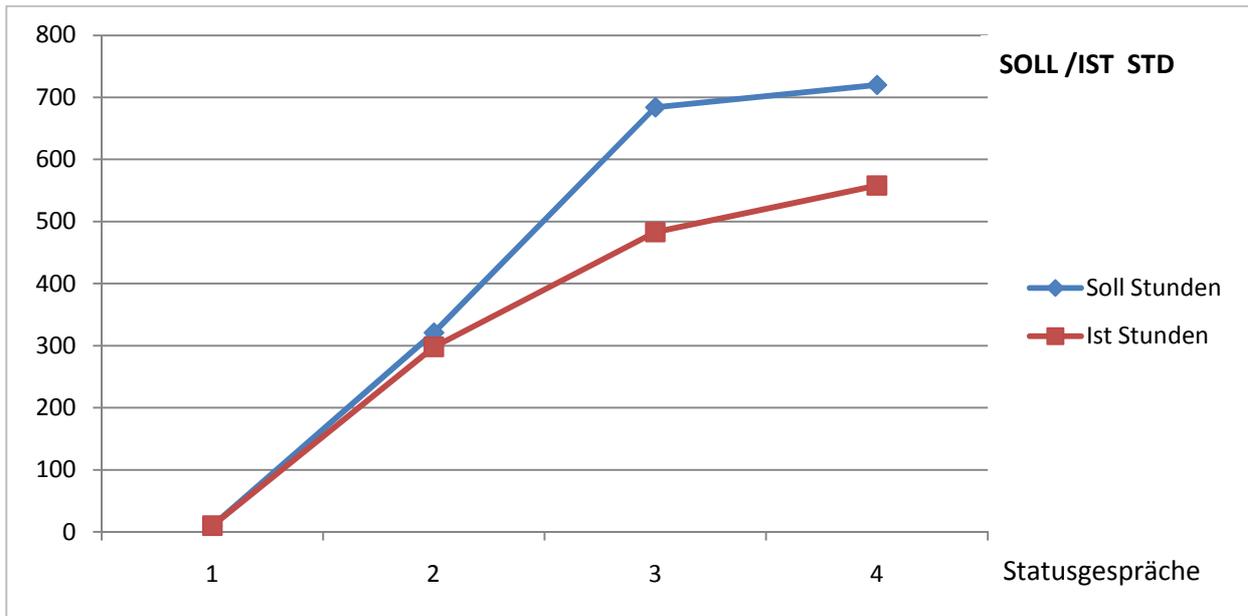

Meilensteintrendanalyse

Projekt: Baustellendokumentation

Aktualisierung: 18.11.2009

Projektstart: 07.10.2009

Baustellendokumentation mit Stand vom 18. November 09

Titel des Meilensteins	Plan-Termin zum Projektbeginn	Neue Abschätzung der Termine zu den jeweiligen Berichtsterminen						
		1	2	3	4	5	6	7
	07.10.2009	21.10.2009	04.11.2009	18.11.2009	02.12.2009	09.12.2009	16.12.2009	23.12.2009
Informationsbeschaffung	26.10.2009	26.10.2009						
Systementwicklung	10.11.2009	17.11.2009	10.11.2009					
System Umsetzung	25.11.2009	02.12.2009	02.12.2009	25.11.2009				
System alpha Version	02.12.2009	09.12.2009	09.12.2009	02.12.2009				
Flussdiagramm	26.11.2009	26.11.2009	26.11.2009	01.12.2009				
Präsentation	02.12.2009	02.12.2009	04.12.2009	02.12.2009				
Projektabschluss	21.01.2010	28.01.2010	28.01.2010	21.01.2010				

Statusbericht

Baustellendokumentation mit Stand 18. November 09

